LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)

Nomor: LB/KBN/P1/10/2026 · Periode 1-31 Oktober 2026 · Diterbitkan 30 Oktober 2026

Pemberi kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi
Nomor kontrak	: 600.1.15/KTR-PUPR/012/2026 (2 Maret 2026); Addendum I 12 Oktober 2026
Nilai kontrak	: **Rp 39.294.000.000** (termasuk PPN 11%)
Masa pelaksanaan	: 16 Maret 2026 s.d. 30 Januari 2027 (300 + 21 hari kalender), sisa 91 hari
Lokasi	: Jl. Pemda, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi
Kepada	: PPK Dinas PUPR Kab. Bekasi; Konsultan Pengawas PT Cipta Manunggal Karya

1. Ringkasan eksekutif

Progres fisik kumulatif
71,8%
Rencana 78,5%

Deviasi terhadap rencana
-6,7%
Terlambat · SPI 0,91


Biaya terserap kumulatif
Rp 23.100 jt
Anggaran biaya Rp 31.600 jt (73,1%) · CPI 0,98

Progres fisik Oktober mencapai **71,8%** atau **6,7 poin di bawah rencana** (78,5%). Penyebab utama adalah cuaca dan keterlambatan lift. Biaya terserap sedikit di atas nilai hasil (CPI 0,98) sehingga laba kotor terproyeksi tetap sekitar 9%. Dua tindakan administratif mendesak: perpanjangan jaminan pelaksanaan dan polis CAR sebelum 30 November, serta tindak lanjut hasil uji beton K-350.

2. Progres fisik

No	Uraian pekerjaan	Bobot	Realisasi	Bobot terselesaikan	Keterangan
1	Persiapan dan struktur bawah (pondasi bore pile, pile cap, sloof)	12,0%	100,0%	12,0%	Selesai
2	Struktur atas (kolom, balok, pelat lantai 1-4, dak)	30,0%	96,3%	28,9%	Pelat atap selesai dicor 24 Okt
3	Arsitektur (dinding, plesteran, lantai, plafon, fasad)	25,0%	64,9%	16,2%	Fasad ACP lantai 2 sedang berjalan
4	MEP (listrik, plumbing, tata udara, proteksi kebakaran, lift)	22,0%	57,0%	12,5%	Cable tray dan pipa sampai lantai 3
5	Lansekap, utilitas luar, dan pekerjaan penutup	11,0%	19,7%	2,2%	Paving halaman belakang dikurangi (Addendum I)
	Jumlah progres fisik kumulatif	**100,0%**		**71,8%**	**Rencana kumulatif 78,5%**

Kurva S (kumulatif)

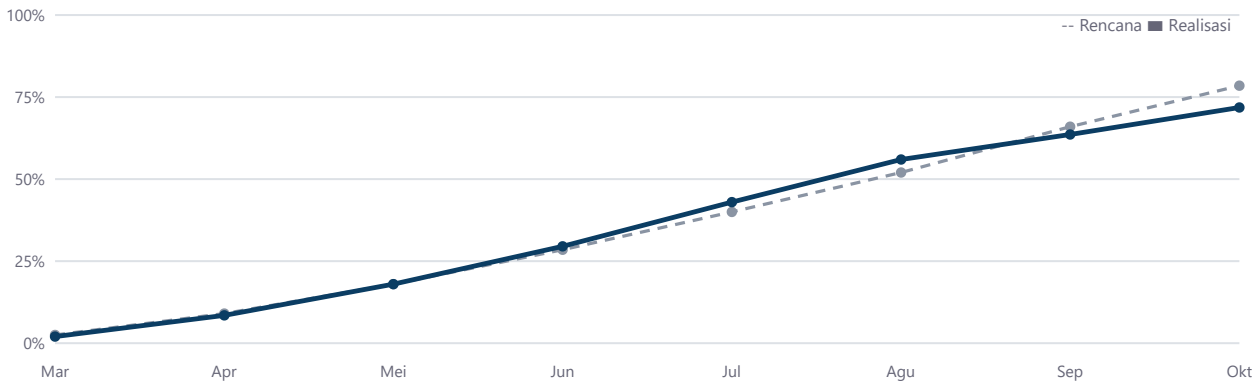

Periode	Rencana kumulatif	Realisasi kumulatif	Deviasi
September 2026	66,0%	63,6%	-2,4%
Oktober 2026	78,5%	71,8%	-6,7%
Pertumbuhan bulan ini	12,5%	8,2%	

3. Keuangan proyek

Uraian	Nilai
Anggaran biaya pelaksanaan (HPP)	Rp 31.600.000.000
Biaya terserap kumulatif sampai 31 Oktober 2026	Rp 23.100.000.000
Nilai hasil (earned value) = progres x anggaran biaya	Rp 22.688.800.000
Selisih biaya (nilai hasil - biaya terserap)	Rp -411.200.000
Sisa anggaran biaya	Rp 8.500.000.000
Perkiraan biaya pada penyelesaian (EAC = anggaran / CPI)	Rp 32.172.701.950
Perkiraan laba kotor pada penyelesaian	Rp 3.227.298.050

Rincian biaya terserap	Nilai	Porsi
Material (beton, besi, bata ringan, finishing)	Rp 11.620.000.000	50,3%
Upah dan subkontraktor (struktur, MEP)	Rp 7.480.000.000	32,4%
Sewa alat dan BBM	Rp 1.930.000.000	8,4%
Overhead proyek (staf, K3, sewa kantor, asuransi)	Rp 1.370.000.000	5,9%
Lain-lain (perizinan, pengujian, dokumentasi)	Rp 700.000.000	3,0%
Jumlah	**Rp 23.100.000.000**	**100,0%**

4. Sumber daya

Tenaga kerja	Jumlah
Staf manajemen proyek dan pengawas lapangan	14
Tukang dan pekerja KBN dan subkon (rata-rata harian)	186
Operator dan teknisi alat	23
Petugas K3 dan keamanan	6

Tenaga kerja	Jumlah
Jumlah tenaga kerja rata-rata per hari	**229 orang**

Peralatan di lokasi	Unit / kondisi
Tower crane TC-5013	1 unit, baik
Mobile crane 25 ton (6 hari bulan ini)	1 unit, baik
Concrete pump dan truk mixer	Sewa, 24 trip
Hoist material / passenger-cum-goods hoist	2 unit, baik
Genset 100 kVA (listrik sementara)	1 unit, baik

Material utama	Terpasang bulan ini	Stok di lokasi
Beton K-350 (m3)	640	-
Beton K-300 (m3)	120	-
Besi ulir (kg)	89.000	31.500
Bata ringan (m3)	312	95
Semen untuk plesteran (zak)	5.400	620

5. Cuaca dan keselamatan kerja

Cuaca Oktober	: 17 hari hujan, curah hujan tertinggi 82 mm pada 9 Oktober; kehilangan 6,5 hari kerja efektif.
Jam kerja aman (tanpa LTI)	: 412.600 jam-orang sejak awal proyek; Oktober: 41.850 jam
Insiden	: 1 kecelakaan ringan (P3K), 1 hampir celaka (near miss) perancah lantai 4. Lihat laporan K3 terpisah.
Inspeksi dan toolbox meeting	: 4 inspeksi mingguan, 26 toolbox meeting, 1 simulasi tanggap darurat kebakaran

6. Kendala dan tindak lanjut

No	Kendala	Dampak	Tindak lanjut	PIC / Target
1	Hujan ekstrem Agustus-Oktober	Hilang 21 hari kerja efektif sejak Agustus; deviasi -6,7%	Addendum I (+21 hari); lembur malam untuk pekerjaan dalam	Mgr Proyek / 30 Nov
2	Kuat tekan beton K-350 sampel 5 Sept di bawah syarat	Perlu uji lanjut core drill pada kolom as C-4 dan C-5	Core drill dan analisis struktural oleh konsultan; klaim ke pemasok beton	QC / 7 Nov
3	Pengiriman lift tertunda pabrikan	Pemasangan lift mundur 3 minggu	Percepatan dengan pengiriman parsial; negosiasi denda ke pemasok lift	Subkon MEP / 20 Nov
4	Perpanjangan jaminan pelaksanaan dan polis CAR	Wajib akibat Addendum I	Ajukan endorsement ke bank dan asuransi	Direktur Keuangan / 13 Nov

7. Rencana bulan November 2026

- Target progres kumulatif akhir November 82,0% (pertumbuhan 10,2%).

- Selesaikan pekerjaan dinding dan plesteran lantai 3-4, mulai pemasangan plafon lantai 1-2.
- Instalasi panel LVMDP, genset 400 kVA, dan uji tekan hidran.
- Ajukan Termin IV pada progres 90% (perkiraan awal Desember 2026).

Perlu rata-rata pertumbuhan **9,3% per bulan** sampai 30 Januari 2027 untuk menyelesaikan sisa 28,2%; pertumbuhan Oktober 8,2%.

Bekasi

Dibuat oleh	Disetujui
Manajer Proyek	Direktur Operasional
Ir. Wahyu Prasetyo, M.T.	**Ir. Agus Hermawan, M.M.**
KBN Konstruksi	PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.
