PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Preservasi Jalan Provinsi Ruas Cikarang-Cibarusah (Pelapisan AC-WC dan Rehabilitasi Drainase)

Nomor: LB/KBN/P2/10/2026 · Periode 1-31 Oktober 2026 · Diterbitkan 30 Oktober 2026

Pemberi kerja	: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi (UPTD Wilayah II)
Nomor kontrak	: 620/KTR-BM/UPTD-II/0247/2026 (20 Februari 2026)
Nilai kontrak	: **Rp 21.312.000.000** (termasuk PPN 11%)
Masa pelaksanaan	: 2 Maret 2026 s.d. 26 Desember 2026 (300 hari kalender), sisa 56 hari
Lokasi	: Ruas Cikarang-Cibarusah, STA 0+000 s.d. STA 14+500
Kepada	: PPK UPTD Wilayah II Dinas Bina Marga; Konsultan Supervisi PT Marga Konsultan Utama

1. Ringkasan eksekutif

Progres fisik kumulatif
64,2%
Rencana 60,0%

Deviasi terhadap rencana
+4,2%
Lebih cepat · SPI 1,07


Biaya terserap kumulatif
Rp 10.400 jt
Anggaran biaya Rp 16.800 jt (61,9%) · CPI 1,04

Progres fisik **64,2%**, **4,2 poin lebih cepat** dari rencana (60,0%), biaya terserap di bawah nilai hasil (CPI 1,04). Proyek berjalan baik. Risiko administratif: polis CAR habis lebih awal dari masa kontrak dan satu CCO saluran belum disetujui.

2. Progres fisik

No	Uraian pekerjaan	Bobot	Realisasi	Bobot terselesaikan	Keterangan
1	Mobilisasi, manajemen mutu, dan K3 konstruksi	6,0%	100,0%	6,0%	Selesai
2	Drainase dan pekerjaan pelengkap (saluran U-ditch, gorong-gorong)	22,0%	75,3%	16,6%	Sisa 800 m saluran STA 12+000
3	Perbaikan perkerasan (cold milling dan patching)	18,0%	100,0%	18,0%	Selesai
4	Lapis pondasi agregat (LPA)	14,0%	100,0%	14,0%	Selesai
5	Lapis aus AC-WC (tebal 5 cm)	32,0%	30,1%	9,6%	Terhampar 5,5 km dari 14,5 km
6	Marka, rambu, dan perlengkapan jalan	8,0%	0,0%	0,0%	Dimulai setelah AC-WC selesai
	Jumlah progres fisik kumulatif	**100,0%**		**64,2%**	**Rencana kumulatif 60,0%**

Kurva S (kumulatif)

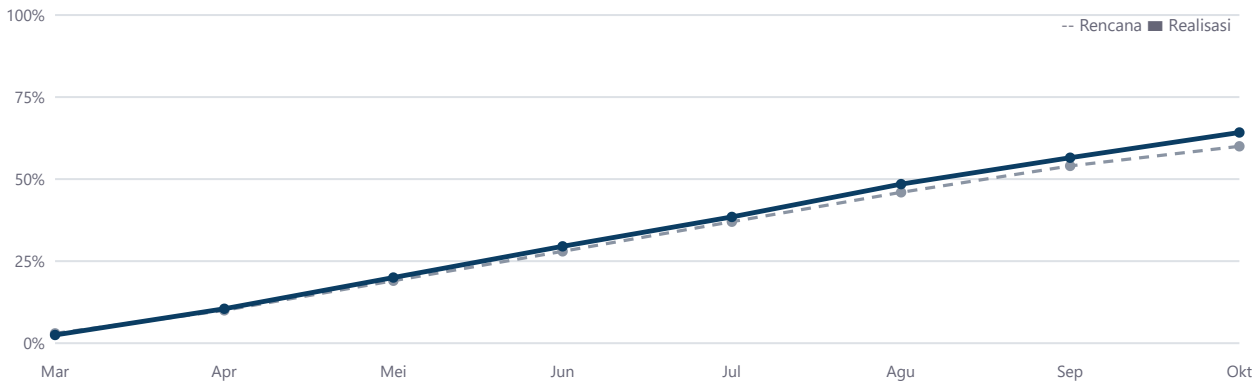

Periode	Rencana kumulatif	Realisasi kumulatif	Deviasi
September 2026	54,0%	56,5%	2,5%
Oktober 2026	60,0%	64,2%	4,2%
Pertumbuhan bulan ini	6,0%	7,7%	

3. Keuangan proyek

Uraian	Nilai
Anggaran biaya pelaksanaan (HPP)	Rp 16.800.000.000
Biaya terserap kumulatif sampai 31 Oktober 2026	Rp 10.400.000.000
Nilai hasil (earned value) = progres x anggaran biaya	Rp 10.785.600.000
Selisih biaya (nilai hasil - biaya terserap)	Rp 385.600.000
Sisa anggaran biaya	Rp 6.400.000.000
Perkiraan biaya pada penyelesaian (EAC = anggaran / CPI)	Rp 16.199.376.947
Perkiraan laba kotor pada penyelesaian	Rp 3.000.623.053

Rincian biaya terserap	Nilai	Porsi
Material (aspal, agregat, beton, pracetak)	Rp 5.280.000.000	50,8%
Upah dan subkontraktor	Rp 1.830.000.000	17,6%
Sewa alat, BBM, dan angkutan	Rp 2.410.000.000	23,2%
Overhead proyek	Rp 640.000.000	6,2%
Lain-lain (pengujian, lalu lintas, K3)	Rp 240.000.000	2,3%
Jumlah	**Rp 10.400.000.000**	**100,0%**

4. Sumber daya

Tenaga kerja	Jumlah
Staf manajemen proyek dan pengawas lapangan	9
Pekerja jalan (hampar, pemadatan, drainase)	74
Operator AMP, finisher, roller, dump truck	38
Petugas K3, pengatur lalu lintas, rambu	14

Tenaga kerja	Jumlah
Jumlah tenaga kerja rata-rata per hari	**135 orang**

Peralatan di lokasi	Unit / kondisi
Asphalt finisher	1 unit, baik
Vibro roller 12 ton dan tire roller	2 unit sewa, baik
Excavator PC200 (drainase)	1 unit sewa, 210 jam
Dump truck 14 ton	18 unit (10 milik, 8 sewa)
Water tank truck dan sweeper	2 unit, baik

Material utama	Terpasang bulan ini	Stok di lokasi
AC-WC (ton)	2.150	Pasok langsung dari AMP
Aspal emulsi CRS-1 (liter)	18.000	2.600
Agregat LPA (m3)	0	Selesai
U-ditch pracetak 60x60 (unit)	310	120
Cat marka thermoplastic (kg)	0	4.800

5. Cuaca dan keselamatan kerja

Cuaca Oktober	: 14 hari hujan; pelapisan aspal hanya dilakukan pada 17 hari kerja kering dan suhu hampar di atas 125 derajat C.
Jam kerja aman (tanpa LTI)	: 188.400 jam-orang sejak awal; Oktober: 21.200 jam
Insiden	: Tidak ada kecelakaan kerja. 1 hampir celaka (kendaraan umum masuk zona kerja), rambu dan flagman ditambah.
Inspeksi dan toolbox meeting	: 4 inspeksi, 16 toolbox meeting, audit rekayasa lalu lintas oleh dishub

6. Kendala dan tindak lanjut

No	Kendala	Dampak	Tindak lanjut	PIC / Target
1	Arus lalu lintas padat jam sibuk	Produktivitas hamparan turun 18%	Pelaksanaan malam hari (21.00-05.00) di segmen padat	Supervisor / berjalan
2	Saluran eksisting menyimpang dari gambar	Tambah galian 120 m3 dan perubahan elevasi	Usulan CCO ke PPK, menunggu persetujuan	Mgr Proyek / 12 Nov
3	Polis CAR berakhir 30 November 2026 sebelum kontrak selesai (26 Des)	Risiko tidak terlindungi 26 hari	Perpanjangan polis ke asuransi (lihat dokumen polis)	Direktur Keuangan / 20 Nov

7. Rencana bulan November 2026

- Hamparan AC-WC tambahan 5 km (target kumulatif 10,5 km).
- Selesaikan sisa saluran STA 12+000.
- Uji kepadatan lapangan dan uji Marshall per 500 m hamparan.
- Siapkan tagihan opname Oktober (progres kumulatif 64,2%).

Perlu rata-rata pertumbuhan **19,2% per bulan** sampai 26 Desember 2026 untuk menyelesaikan sisa 35,8%; pertumbuhan Oktober 7,7%.

Bekasi

Dibuat oleh	Disetujui
Manajer Proyek	Direktur Operasional
Ir. Hasanudin, M.T.	**Ir. Agus Hermawan, M.M.**
KBN Konstruksi	PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.
