PT KARYA BUMI NUSANTARA KONSTRUKSI
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530 · Telp (021) 8970-4421 · NPWP 02.841.376.5-407.000

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pembangunan Ruko 3 Lantai (8 Unit) Cluster Mutiara Square Bekasi

Nomor: LB/KBN/P3/10/2026 · Periode 1-31 Oktober 2026 · Diterbitkan 30 Oktober 2026

Pemberi kerja	: PT Mutiara Properti Sejahtera
Nomor kontrak	: 017/MPS-KBN/SPK-KONS/III/2026 (24 Maret 2026)
Nilai kontrak	: **Rp 14.652.000.000** (termasuk PPN 11%)
Masa pelaksanaan	: 1 April 2026 s.d. 26 Desember 2026 (270 hari kalender), sisa 56 hari
Lokasi	: Cluster Mutiara Square Blok R, Bekasi Barat
Kepada	: Direksi PT Mutiara Properti Sejahtera; Konsultan MK PT Cipta Manunggal Karya

1. Ringkasan eksekutif

Progres fisik kumulatif
41,0%
Rencana 55,0%

Deviasi terhadap rencana
-14,0%
Terlambat · SPI 0,75


Biaya terserap kumulatif
Rp 5.900 jt
Anggaran biaya Rp 11.900 jt (49,6%) · CPI 0,83

Progres fisik **41,0%**, **14,0 poin di bawah rencana** (55,0%), SPI 0,75. Biaya terserap Rp 5,90 miliar melampaui nilai hasil Rp 4,88 miliar (CPI 0,83), sehingga **proyek ini berpotensi rugi** bila tidak ada tindakan: perkiraan biaya akhir melebihi anggaran sekitar Rp 2,5 miliar. Pemilik proyek menunggak Termin 1 dan telah mengirim Surat Teguran I. Diperlukan keputusan manajemen soal penagihan, percepatan, dan klaim tambahan akibat perubahan denah.

2. Progres fisik

No	Uraian pekerjaan	Bobot	Realisasi	Bobot terselesaikan	Keterangan
1	Persiapan, pondasi, dan struktur bawah	15,0%	100,0%	15,0%	Selesai
2	Struktur atas 8 unit (kolom, balok, pelat lantai 1-3)	34,0%	61,5%	20,9%	Unit 1-5 pelat lantai 3 selesai, unit 6-8 lantai 2
3	Arsitektur (dinding, plesteran, lantai, fasad)	28,0%	13,9%	3,9%	Dinding unit 1-3 selesai
4	MEP (listrik, plumbing, sanitair)	15,0%	7,9%	1,2%	Pipa tanam unit 1-4
5	Pekerjaan penutup dan lingkungan	8,0%	0,0%	0,0%	Belum dimulai
	Jumlah progres fisik kumulatif	**100,0%**		**41,0%**	**Rencana kumulatif 55,0%**

Kurva S (kumulatif)

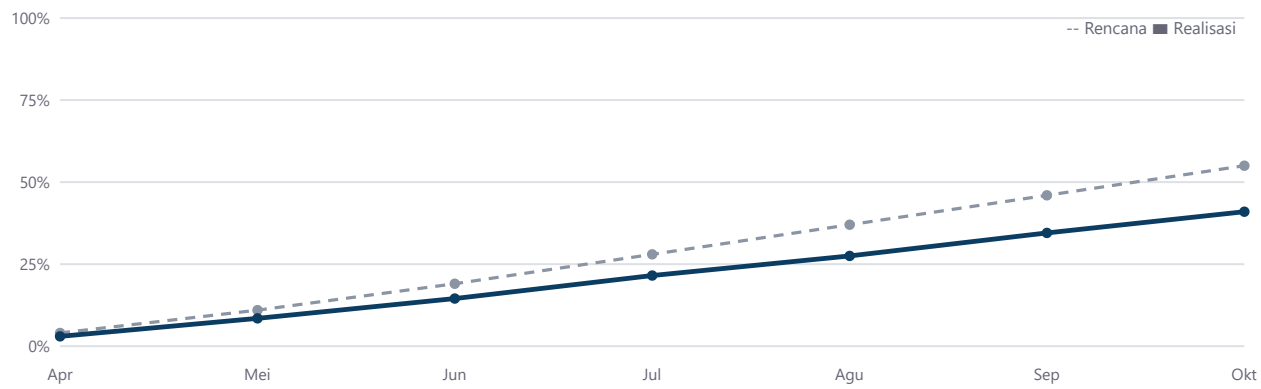

Periode	Rencana kumulatif	Realisasi kumulatif	Deviasi
September 2026	46,0%	34,5%	-11,5%
Oktober 2026	55,0%	41,0%	-14,0%
Pertumbuhan bulan ini	9,0%	6,5%	

3. Keuangan proyek

Uraian	Nilai
Anggaran biaya pelaksanaan (HPP)	Rp 11.900.000.000
Biaya terserap kumulatif sampai 31 Oktober 2026	Rp 5.900.000.000
Nilai hasil (earned value) = progres x anggaran biaya	Rp 4.879.000.000
Selisih biaya (nilai hasil - biaya terserap)	Rp -1.021.000.000
Sisa anggaran biaya	Rp 6.000.000.000
Perkiraan biaya pada penyelesaian (EAC = anggaran / CPI)	Rp 14.390.243.902
Perkiraan laba kotor pada penyelesaian	Rp -1.190.243.902

Rincian biaya terserap	Nilai	Porsi
Material	Rp 3.010.000.000	51,0%
Upah dan subkontraktor	Rp 1.690.000.000	28,6%
Sewa alat dan BBM	Rp 560.000.000	9,5%
Overhead proyek	Rp 410.000.000	6,9%
Lain-lain (pengujian, perizinan)	Rp 230.000.000	3,9%
Jumlah	**Rp 5.900.000.000**	**100,0%**

4. Sumber daya

Tenaga kerja	Jumlah
Staf manajemen proyek dan pengawas	8
Tukang dan pekerja (borongan dan harian)	96
Operator dan teknisi	9
Jumlah tenaga kerja rata-rata per hari	**113 orang**

Peralatan di lokasi	Unit / kondisi
Concrete mixer dan vibrator	4 unit
Scaffolding dan bekisting sistem	2.400 m2
Truk dan loader kecil	3 unit
Tower crane	Tidak ada (memakai mobile crane sewa)

Material utama	Terpasang bulan ini	Stok di lokasi
Beton K-300 (m3)	312	-
Besi ulir (kg)	58.000	14.200
Bata ringan (m3)	196	60
Semen plesteran (zak)	2.900	310

5. Cuaca dan keselamatan kerja

Cuaca Oktober	: 15 hari hujan; genangan lokasi pada 9-11 Oktober menghentikan kerja 3 hari.
Jam kerja aman (tanpa LTI)	: 97.300 jam-orang sejak awal; Oktober: 12.400 jam
Insiden	: Tidak ada kecelakaan kerja.
Inspeksi dan toolbox meeting	: 4 inspeksi, 12 toolbox meeting

6. Kendala dan tindak lanjut

No	Kendala	Dampak	Tindak lanjut	PIC / Target
1	Termin 1 (Rp 3,00 miliar) belum dibayar pemilik, lewat 52 hari	Arus kas proyek negatif; pembayaran subkon dan material tertunda	Penagihan formal, pertemuan direksi 2 Nov; opsi hentikan kerja sementara bila belum dibayar	Direktur Utama / 5 Nov
2	Perubahan denah unit 6-8 oleh pemilik (tambah 1 kamar mandi)	Revisi struktur dan gambar kerja, mundur 12 hari	Minta persetujuan tertulis CCO dan tambahan waktu	Mgr Proyek / 8 Nov
3	Suplai tukang terbatas akhir pekan	Produktivitas -11%	Tambah 25 tukang borongan dari mandor Sugeng	Mandor / berjalan
4	Surat Teguran I dari pemilik (23 Okt)	Risiko denda 1 permil per hari	Jawaban tertulis dan rencana percepatan (Addendum waktu)	Dir. Utama / 31 Okt

7. Rencana bulan November 2026

- Target progres kumulatif akhir November 49,5% (pertumbuhan 8,5%).
- Selesaikan pelat lantai 3 unit 6-8, mulai pekerjaan atap baja ringan unit 1-5.
- Rapat percepatan dengan pemilik dan MK membahas penyesuaian jadwal.

Perlu rata-rata pertumbuhan **31,6% per bulan** sampai 26 Desember 2026 untuk menyelesaikan sisa 59,0%; pertumbuhan Oktober 6,5%.

Bekasi

Dibuat oleh
Manajer Proyek

Disetujui
Direktur Operasional

Ir. Yudi Kurniawan, S.T.
KBN Konstruksi

Ir. Agus Hermawan, M.M.
PT Karya Bumi Nusantara
Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.
