LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Renovasi dan Perluasan Gudang Pabrik PT Prima Plastindo Jaya (Lantai 1.800 m2)

Nomor: LB/KBN/P4/10/2026 · Periode 1-31 Oktober 2026 · Diterbitkan 30 Oktober 2026

Pemberi kerja	: PT Prima Plastindo Jaya
Nomor kontrak	: PPJ/KBN/SPK/0612/2026 (26 Mei 2026)
Nilai kontrak	: **Rp 6.216.000.000** (termasuk PPN 11%)
Masa pelaksanaan	: 1 Juni 2026 s.d. 27 November 2026 (180 hari kalender), sisa 27 hari
Lokasi	: Kawasan MM2100 Blok KK-3, Cikarang Barat
Kepada	: Direktur Operasional PT Prima Plastindo Jaya

1. Ringkasan eksekutif

Progres fisik kumulatif
88,5%
Rencana 85,0%

Deviasi terhadap rencana
+3,5%
Lebih cepat · SPI 1,04


Biaya terserap kumulatif
Rp 4.200 jt
Anggaran biaya Rp 4.900 jt (85,7%) · CPI 1,03

Progres fisik **88,5%**, **3,5 poin lebih cepat** dari rencana (85,0%); CPI 1,03. Proyek sehat dan siap serah terima 20 November. Satu permintaan tambahan dari pemilik (dock leveler) menunggu persetujuan harga.

2. Progres fisik

No	Uraian pekerjaan	Bobot	Realisasi	Bobot terselesaikan	Keterangan
1	Pembongkaran dan persiapan	8,0%	100,0%	8,0%	Selesai
2	Pondasi dan lantai kerja industri 1.800 m2	30,0%	100,0%	30,0%	Floor hardener selesai 12 Okt
3	Struktur baja portal dan atap sandwich panel	34,0%	100,8%	34,3%	Atap selesai, sisa talang
4	MEP (listrik, high-bay LED, sprinkler)	20,0%	72,3%	14,5%	Panel terpasang, sprinkler 70%
5	Pengecatan, marka lantai, dan penyelesaian	8,0%	21,9%	1,8%	Marka lantai akan dikerjakan setelah uji beban
	Jumlah progres fisik kumulatif	**100,0%**		**88,5%**	**Rencana kumulatif 85,0%**

Kurva S (kumulatif)

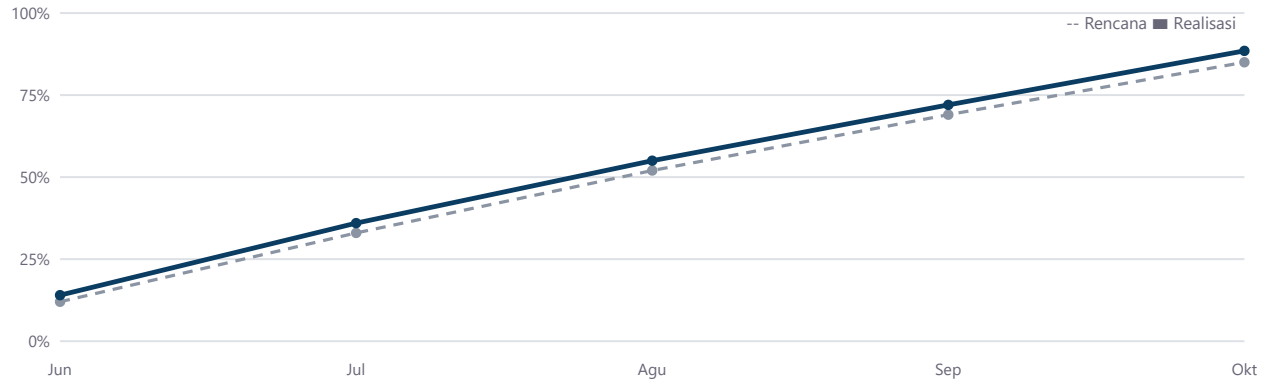

Periode	Rencana kumulatif	Realisasi kumulatif	Deviasi
September 2026	69,0%	72,0%	3,0%
Oktober 2026	85,0%	88,5%	3,5%
Pertumbuhan bulan ini	16,0%	16,5%	

3. Keuangan proyek

Uraian	Nilai
Anggaran biaya pelaksanaan (HPP)	Rp 4.900.000.000
Biaya terserap kumulatif sampai 31 Oktober 2026	Rp 4.200.000.000
Nilai hasil (earned value) = progres x anggaran biaya	Rp 4.336.500.000
Selisih biaya (nilai hasil - biaya terserap)	Rp 136.500.000
Sisa anggaran biaya	Rp 700.000.000
Perkiraan biaya pada penyelesaian (EAC = anggaran / CPI)	Rp 4.745.762.712
Perkiraan laba kotor pada penyelesaian	Rp 854.237.288

Rincian biaya terserap	Nilai	Porsi
Material	Rp 2.210.000.000	52,6%
Upah dan subkontraktor	Rp 1.060.000.000	25,2%
Sewa alat dan BBM	Rp 410.000.000	9,8%
Overhead proyek	Rp 360.000.000	8,6%
Lain-lain	Rp 160.000.000	3,8%
Jumlah	**Rp 4.200.000.000**	**100,0%**

4. Sumber daya

Tenaga kerja	Jumlah
Staf proyek	5
Tukang dan pekerja	54
Teknisi MEP dan operator alat	12
Jumlah tenaga kerja rata-rata per hari	**71 orang**

Peralatan di lokasi	Unit / kondisi
Mobile crane 25 ton	Sewa, 3 hari
Scissor lift dan boom lift	2 unit
Concrete floor finishing machine	4 unit

Material utama	Terpasang bulan ini	Stok di lokasi
Sandwich panel (m2)	620	0
Kabel dan panel listrik	sesuai gambar	-
Pipa sprinkler (m)	760	440

5. Cuaca dan keselamatan kerja

Cuaca Oktober	: 11 hari hujan; pekerjaan atap dijadwalkan ulang 4 hari.
Jam kerja aman (tanpa LTI)	: 121.600 jam-orang sejak awal; Oktober: 12.900 jam
Insiden	: Tidak ada kecelakaan. Pekerjaan di area produksi aktif tanpa gangguan.
Inspeksi dan toolbox meeting	: 4 inspeksi, induksi K3 pabrik untuk 14 pekerja baru

6. Kendala dan tindak lanjut

No	Kendala	Dampak	Tindak lanjut	PIC / Target
1	Pemilik meminta tambah 2 pintu dock leveler	Tambah pekerjaan sekitar Rp 140 juta	Penawaran CCO dikirim 21 Okt, menunggu persetujuan	Mgr Proyek / 5 Nov
2	Uji beban lantai 5 ton/m2	Wajib sebelum serah terima	Jadwal uji 6 November oleh laboratorium independen	QC / 6 Nov

7. Rencana bulan November 2026

- Selesaikan talang, sprinkler, dan commissioning listrik.
- Uji beban lantai, uji sprinkler, dan pengecatan akhir.
- Serah terima pertama (PHO) direncanakan 20 November 2026; kontrak berakhir 27 November.
- Tagih Tahap 4 (progres 95%) setelah uji fungsi.

Perlu rata-rata pertumbuhan **12,8% per bulan** sampai 27 November 2026 untuk menyelesaikan sisa 11,5%; pertumbuhan Oktober 16,5%.

Bekasi

Dibuat oleh
Manajer Proyek

Ir. Fajar Nugroho, S.T.
KBN Konstruksi

Disetujui
Direktur Operasional

Ir. Agus Hermawan, M.M.
PT Karya Bumi Nusantara
Konstruksi

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.
